

工事進捗報告書 第6回

クボタ環境・ヤマウラ特定建設工事共同企業体



■進捗状況 全景

2026.2.11撮影



■外部 屋上シート防水 外壁吹付状況

■内部 1階 設備配管状況

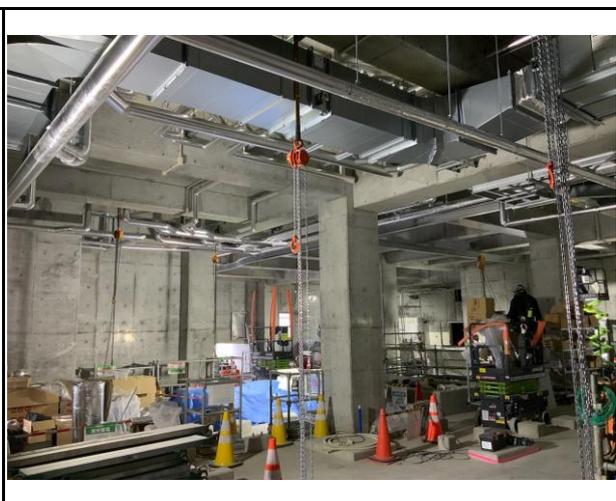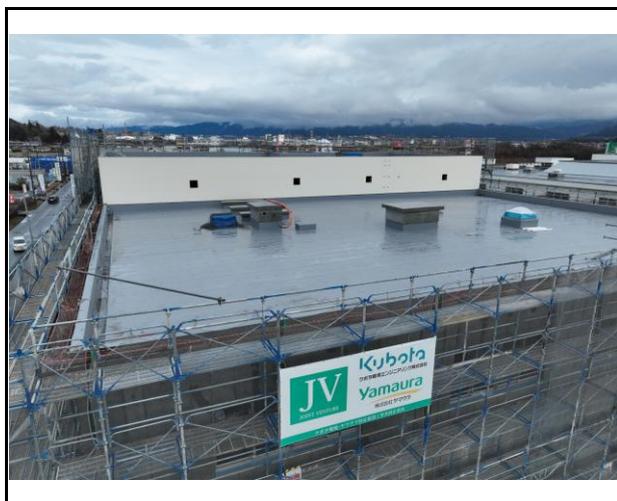

12月に躯体工事が完了し、外部におきましては屋上シート防水と外壁吹付工事一部を先行して施工しました。今年1月より本格的にプラント機器搬入が開始となり、地下階と1階では配管・据付作業を進めています。また、2月より2階の内装工事に着手しています。外構におきましても、構造物の据付を進めています。地域の皆様には日頃より工事におきまして、大変ご迷惑をお掛けしております。安全に留意して進めて参りますのでご理解、ご協力の程どうぞよろしくお願い致します。

■プラント工事状況写真

	<p>プラント工事 処理棟 機械設備配管 地階</p>		<p>処理棟 1階 プラント工事 機器据付</p>
---	---	--	---------------------------------------

■ 2026年3月～2026年5月 工事予定になります。

【3カ月間の主な工事内容】

* 2026年3月の工事予定

処理棟 外部（吹付塗装工事）
内部（内装工事・建築電気,機械設備工事・プラント設備工事）

* 2026年4月の工事予定

処理棟 外部（吹付塗装工事）
内部（内装工事・建築電気,機械設備工事・プラント設備工事）
外部 外構工事

* 2026年5月の工事予定

処理棟 内部（内装工事・建築電気,機械設備工事・プラント設備工事）
外部 外構工事

■新施設 配置図

* 主要建物

【処理棟】

RC造 地下1F
地上2F

建築面積 1024.46㎡

【車庫棟】

鉄骨造 地上1F

建築面積 133.50㎡

【工期】

令和5年12月21日～令和9年3月31日

