

■現場全景 着工時 2024.11.08撮影




■現場全景 建物完成時 2026.7.31撮影予定



■処理棟1階 正面玄関



■処理棟2階 事務・中央監視室

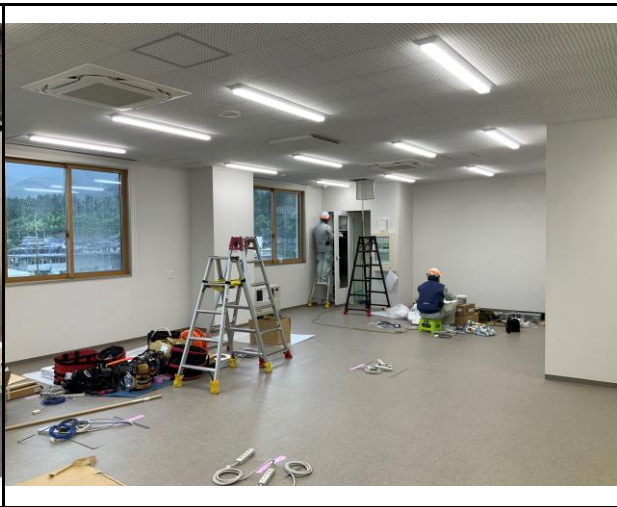

■処理棟2階 会議室



■処理棟地階 ポンプ室




いつも大変お世話になっております。

おかげさまで、8月4日の建築完了検査をもちまして処理棟及び、車庫棟の建築工事が完了となります。地域の皆様には、工事期間中には多大なるご協力をいただき、誠にありがとうございました。

外構の植栽や池の設置工事は9月頃を予定しておりますが、今後は施設稼働に向けた試運転および調整期間に入ります。

来年2027年3月の竣工に向け、引き続き施設内への工事関係者の出入りなど、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

■ 内部状況

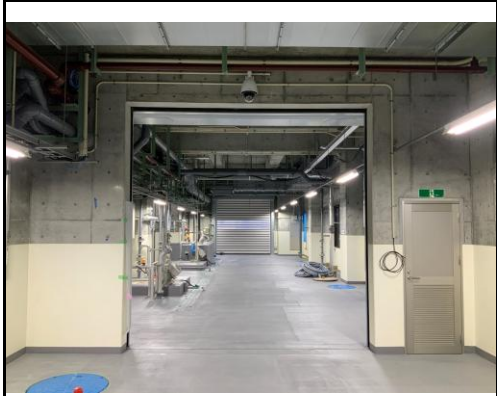	① 職員控室・休憩室 処理棟 2 階		② シヤワ1室 処理棟 2 階
	③ 多機能トイレ 処理棟 1 階		④ 男子トイレ 処理棟 2 階
	⑤ 受入室・受入前室 処理棟 1 階		⑥ 水槽上部室 処理棟 1 階
	⑦ 前処理・脱水機室 処理棟 2 階		⑧ 前処理・脱水機室 処理棟 2 階

■ 2026年9月～2027年3月までの予定になります。

* 2026年9月の予定
処理棟 実負荷運転

* 2026年10月の予定
処理棟 実負荷運転
外部 植栽工事

* 2026年12月～2027年2月の予定
肥料登録期間

* 2027年3月の予定
竣工

* 2026年11月の予定
処理棟 実負荷運転
肥料登録期間

■ 新施設 配置図

* 主要建物
【処理棟】
RC造 地下1F
地上2F
建築面積 1024.46㎡
【車庫棟】
鉄骨造 地上1F
建築面積 133.50㎡
【工期】
令和5年12月21日
～令和9年3月31日

