

工事進捗報告書 第4回

クボタ環境・ヤマウラ特定建設工事共同企業体

■進捗状況 全景

2025.9.5撮影




■ 2025/8/29 2工区1階壁、2階梁・スラブコンクリート打設



地下部分の躯体工事が終わり、建物周りの埋戻が完了しました。8月29日には2工区1階壁、2階梁・スラブコンクリート打設を実施しています。引き続き2階躯体工事を進め、年内には躯体が完成する予定となります。地域の皆様には日頃より工事におきまして、大変ご迷惑をお掛けしております。安全に留意して進めて参りますのでご理解、ご協力の程どうぞよろしくお願い致します。

■ その他工事状況写真

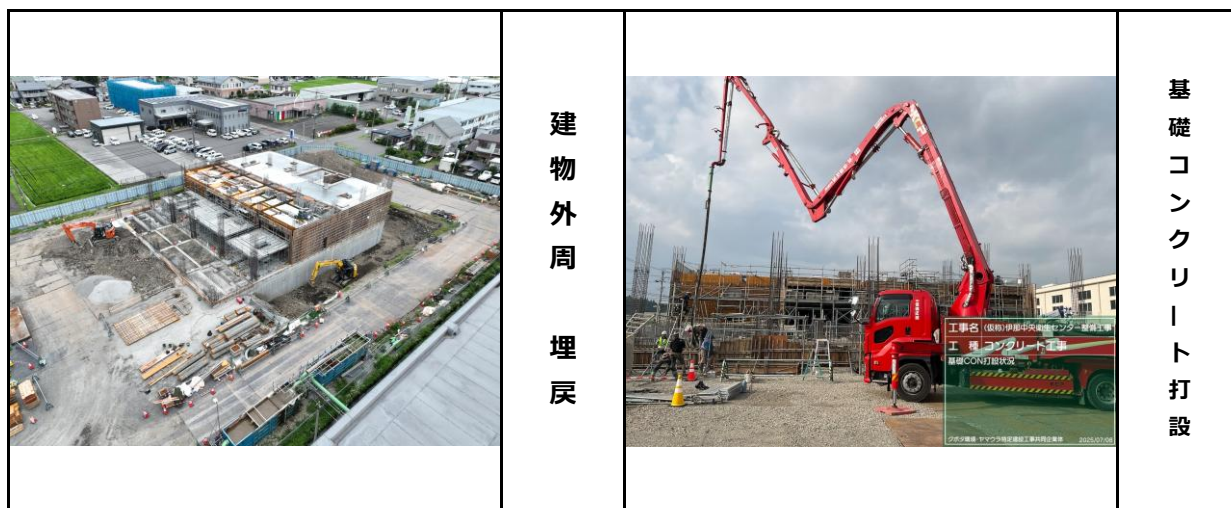

■ 2025年9月～2025年11月 工事予定になります。

【3カ月間の主な工事内容】

* 2025年9月の工事予定

2,R階躯体工事（柱・壁・梁スラブ鉄筋組立・型枠組立）

* 2025年10月の工事予定

2,R階躯体工事（柱・壁・梁スラブ鉄筋組立・型枠組立）

* 2025年11月の工事予定

2,R階躯体工事（柱・壁・梁スラブ鉄筋組立・型枠組立）

■ 新施設 配置図

* 主要建物 【処理棟】

RC造 地下1F
地上2F

建築面積 1024.46㎡

【車庫棟】

鉄骨造 地上1F

建築面積 133.50㎡

【工期】

令和5年12月21日～令和9年3月31日

